

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 11/ 313,322,323/0017/15
 (nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167





ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM11-6922-UM1100284/12 DPROW-K.052.29.2015	0	6	3	5	9	5	6	2	0	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	13/01/2015
Nazwa operacji:	Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku służącego integracji społecznej poprzez budowę świetlicy i ścieżki spacerowej wraz z placem zabaw		
Rodzaj czynności kontrolnych:			
1.	1. Wizytacja w miejscu 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola ex post w wyniku typowania 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji 5. Kontrola uzupełniająca 6. Wizytacja uzupełniająca	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Czynności kontrolne dotyczą etapu:			
	1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. obsługi Wniosku o płatność 3. ex-post	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Czarna Dąbrówka																				
	NIP	8	4	2	1	6	4	4	0	3	5	REGON	7	7	0	9	7	9	5	0	7
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	pomorskie																			
	Powiat/gmina	bytowski							Czarna Dąbrówka												
	Miejscowość/kod	Czarna Dąbrówka							77-116												
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Gdańska 5																			
	Tel.	59 82 12 643					Fax		59 82 12 644												
	E-mail	gmina@czarnadabrowka.pl																			
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	n/d																			
	Powiat/gmina	n/d							n/d												
	Miejscowość/kod	n/d							n/d												
	Ulica i nr domu/lokalu	n/d																			

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT Jan Klasa	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR  Aneta Kanas
			PODINSPEKTOR  Marzena Trynda
			INSPEKTOR 

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)

1. Imię i Nazwisko	Jan Klasa	Stanowisko/funkcja	wójt
--------------------	-----------	--------------------	------

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
	List polecony	<input type="checkbox"/>			
	Inne	<input type="checkbox"/>			
		19/01/2015	Jan Klasa	Agata Kanas	

V. PRZEWODZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH





1. Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę:
---	----------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Agata	Kanas	DO-ZO.087.1011.2014 z dnia 31.12.2014
	Członek zespołu:	Regina	Borowska	DO-ZO.087.1005.2014 z dnia 31.12.2014
	Członek zespołu:	Marzena	Trynda	DO-ZO.087.1007.2014 z dnia 31.12.2014
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Jan	Klasa	Dowód osobisty nr: AXA641884

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:
 W trakcie czynności kontrolnych nie zweryfikowano części zakresu rzeczowego ze względu na zalegającą pokrywę śnieżną. Wyszczególnienie robót nie zweryfikowanych ze względu na zalegającą pokrywę śnieżną – załącznik 3a

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR  Agata Kanas
			PODINSPEKTOR  Marzena Trynda
			INSPEKTOR  Regina Borowska

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Załącznik nr 1. Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - kontrola na miejscu K-02/313;322;323/413-313;322;323/167.
2.	Załącznik nr 2. Zgodność lokalizacji operacji.
3.	Załącznik nr 3. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.
4.	Załącznik nr 4. Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej/ Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.
5.	Załącznik nr 5. Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych
6.	Załącznik nr 6. Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc/ Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.
7.	Załącznik nr 7. Dokumentacja zdjęciowa
8.	
9.	
10.	

Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.).

Pouczenie:


zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm), Podmiot kontrolowany ma możliwość:

- przekazania jednostce kontrolującej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo,
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporcie (zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo,
- odmawiając podpisania raportu, złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu albo od dnia otrzymania stanowiska o nieuwzględnieniu w całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.





Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	21-01-2015r. godz. 09:30 data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych	21-01-2015r. godz. 15:30 data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	n/d okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	21/01/2015 dd/mm/rrrr	Czarna Dąbrówka Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Agata	Kanas
	Regina	Borowska
	Marzena	Trynda
Podmiot kontrolowany	Wykonano w miejscowości Trynda	
	21.01.15 data podpisania Raportu	Jan Kanas podpis
	21.01.15 data otrzymania Raportu	WÓJT Jan Kanas podpis

załącznik 1





Znak sprawy:	UM11-6922-UM1100284/12 DPROW-K.052.29.2015	K-02/313;322;323/413- 313;322;323/167
	LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013	
Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia	
11/313,322,323/0017/15	21-01-2015	

Oś	3	wniosek o płatność
Działanie	Odnowa i rozwój wsi	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	-		X			Zgodnie z załącznikiem nr 2
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I. Koszty inwestycyjne.						
	A Budowa świetlicy wiejskiej						
1)	Stan zerowy	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
2)	Stan surowy	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
3)	Stan wykończeniowy	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
4)	Elementy zewnętrzne	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
5)	Drogi i chodniki	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	B roboty instalacyjne						
1)	instalacja co	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
2)	instalacja wod-kan	kpl	1		X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
3)	przyłącza kanalizacji sanitarnej	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
4)	przyłącza kanalizacji deszczowej	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
5)	przyłącze wodociągowe i co z rur preizolowanych	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	C Roboty elektryczne						

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących		
 Jan Kłoso	 INSPEKTOR Agata Kanas	 INSPEKTOR Regina Borowska	 PODINSPEKTOR Marzena Trynda





1)	wewnętrzna linia zasilająca	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
2)	instalacja wewnętrzna	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
3)	instalacja odgromowa	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
4)	badania i pomiary	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
D	budowa placu zabaw					
1)	ukształtowanie terenu placu zabaw	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
2)	chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
3)	nawierzchnie pisakowe w strefach bezpieczeństwa wokół urządzeń zabawowych	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
4)	plac zabaw dla dzieci	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
5)	nasadzenia roślinne i trawniki	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
E	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - zieleń na terenie rekreacyjnym					
1)	roboty przygotowawcze	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
2)	sadzenie drzew i krzewów liściastych	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
3)	sadzenie drzew i krzewów iglastych	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
4)	sadzenie krzewów żywopłotowych	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
II.	Koszty ogólne.					
1)	dokumentacja techniczna (projekt budowlany, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót)	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.			X		Zgodnie z załącznikiem nr 3.
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			X		Zgodnie z załącznikiem nr 4.
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.			X		Zgodnie z załącznikiem nr 4.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących		
	 INSPEKTOR Agata Kanas	 INSPEKTOR Regina Borowska	 PODINSPEKTOR Marzena Trynda

Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:					
6.	1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją,	X		Zgodnie z załącznikiem nr 5.
	2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.	X		Zgodnie z załącznikiem nr 5.
II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.					
1.	Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.		X		Zgodnie z załącznikiem nr 6.
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.		X		Zgodnie z załącznikiem nr 6.
3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.		X		Zweryfikowano na podstawie: - oględziny w miejscu realizacji projektu miejscowość Rokitki - Dokumentacja zdjęciowa Załącznik nr 7
4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.		X		Zweryfikowano na podstawie: - oględziny w siedzibie beneficjenta - Dokumentacja zdjęciowa Załącznik nr 7
5.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST, ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej sportu oraz ministra właściwego do spraw turystyki.		X		Zweryfikowano na podstawie dokumentów finansowo - księgowych o których mowa w załączniku nr 4.

Uwagi kontrolujących:

Czynności kontrolne obejmowały zakres operacji jednoetapowej.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących		
 WÓJCIK Agnieszka Wójcicka	 INSPEKTOR Agnieszka Kanas	 INSPEKTOR Regina Dorowska	 PODINSPEKTOR Marzena Trynda

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

Umowy nr 00246-6922-UM1100284/12 z dnia 20/10/2012 wraz z późniejszymi zmianami. - lokalizacja inwestycji - województwo pomorskie, powiat bytowski, gmina Czarna Dąbrówka, miejscowość Rokity., działka 209/2, obręb geodezyjny nr 0026 zweryfikowano na podstawie:





1. Projekt budowlano-wykonawczy świetlicy wiejskiej (branża architektoniczno-konstrukcyjna) - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Projekt budowlano-wykonawczy świetlicy wiejskiej (branża elektryczna) - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Projekt budowlano-wykonawczy świetlicy wiejskiej (branża sanitarna) - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
4. Projekt budowlano-wykonawczy świetlicy wiejskiej plan zagospodarowania terenu - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
5. Projekt budowlany zagospodarowania terenu plac zabaw – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem (oryginał został złożony w PINB)- **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
6. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dot. placu zabaw - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
7. Decyzja nr 500/2011/C zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dot. budowy świetlicy - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
8. Decyzja pozwolenie na użytkowanie nr PINB/ID/70032-3/24/2014 dot. świetlicy wiejskiej - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
9. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
10. Oględziny miejsca realizacji projektu - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

Dodatkowe informacje do czynności kontrolnych

Inwestycja została zlokalizowana na działce nr 209/2. Na działkach 208/8 i 208/5 zostały zlokalizowane urządzenia towarzyszące tj. sieć energetyczna, wodociągowa, ciepłownicza i kanalizacyjna. Działki nr 209/2; 208/8 i 208/5 widnieją w pozwoleniu na budowę, projekcie budowlanym, pozwoleniu na użytkowaniu.– **wyjaśnienia beneficjenta załącznik nr 2a**

Załączniki:

2a. Wyjaśnienia beneficjenta

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT Jan Kluso	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	 INSPEKTOR Agata Kanas
			 INSPEKTOR Regina Dorowska
			 POSIADKOWA Marzena Thynda

2015.2a



WÓJT GMINY CZARNA DĄBRÓWKA

ul. Gdańska 5, 77 – 116 Czarna Dąbrówka

tel. 59 8212643, fax. 59 8212644, e-mail gmina@czarnadabrowka.pl


Czarna Dąbrówka 21.01.2015 r.

OŚWIADCZENIE

Gmina Czarna Dąbrówka oświadcza, że powstała świetlica wiejska w ramach projektu pn.: „Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku służącego integracji społecznej poprzez budowę świetlicy i ścieżki spacerowej wraz z placem zabaw w miejscowości Rokity” zlokalizowana jest na działkach 209/2 natomiast na działkach 208/2, 208/5 znajdują się przyłącza.

Oświadczamy również, że pomieszczenia w świetlicy podzielone są w sposób ułatwiający uczestnictwo dzieci małych w wieku 1-5 i starszych oraz młodzieży w organizowanych przez gminę i radę sołecką różnego typu zajęć i imprez. Organizowane w świetlicy zajęcia są nieodpłatne oraz ogólnodostępne.

Z poważaniem


WÓJT
Jan Klasa

Wyk. w 2 egz.

Egz. nr 1 – a/a



Egz. nr 2 – adresat



Sporządził: Agnieszka Ciszewska

EDUKACJA POPRZEZ ZABAWĘ


W świetlicy Wiejskiej w Rokitach od 15 października przez 5 tygodni trwały warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się cyklicznie co tydzień po 3 godziny. Podczas warsztatów uczestnicy nabyli wiedzę w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Dzieci same, przy niewielkiej pomocy rodziców wykonały prace ilustrujące hasła ekologiczne na deskach, które zostały umieszczone na Placu Wiejskim w Rokitach oraz nad Jeziorem Wiejskim. Celem warsztatów było uświadomienie podstawowych problemów ekologicznych, kształtowanie aktywnej postawy ekologicznej oraz szacunku dla przyrody. W przyszłości zamierzamy powtórzyć zajęcia dla różnych grup wiekowych. Podczas zajęć gościliśmy Panią Agnieszkę Głuszkiewicz oraz Panią Magdalenę Wesółkę, które rozmawiały z dziećmi o ekologii i pomagały w warsztatach.

Projekt był współfinansowany przez Starostwo Powiatowe Bytów,
Nadleśnictwo Bytów oraz Nadleśnictwo Cewice a organizatorem było
Stowarzyszenie Rokitnik

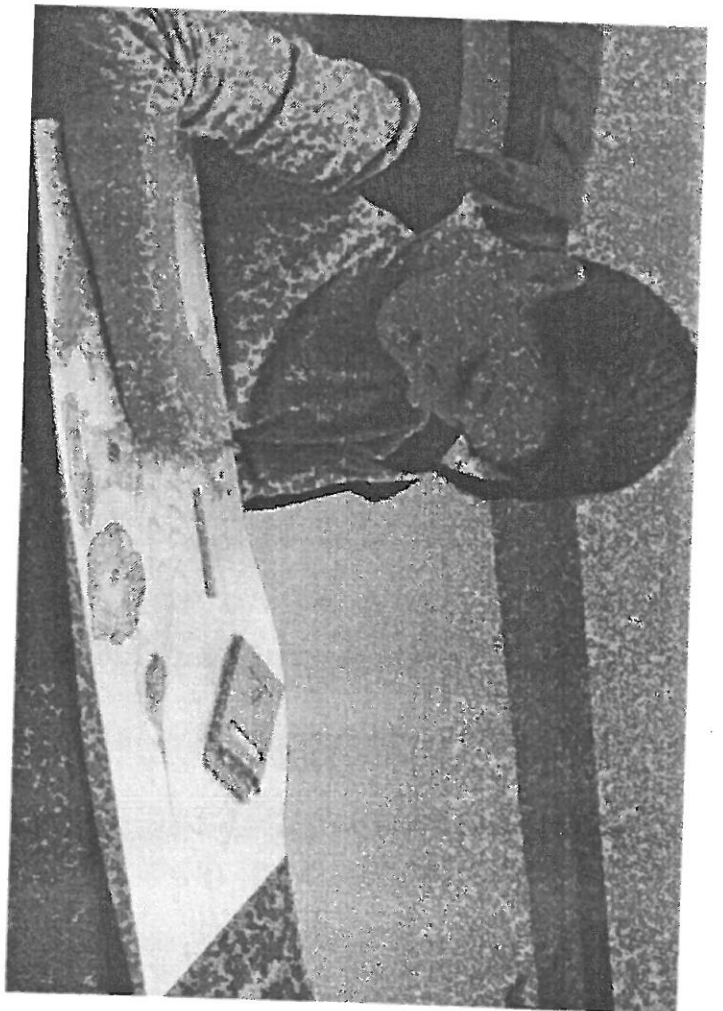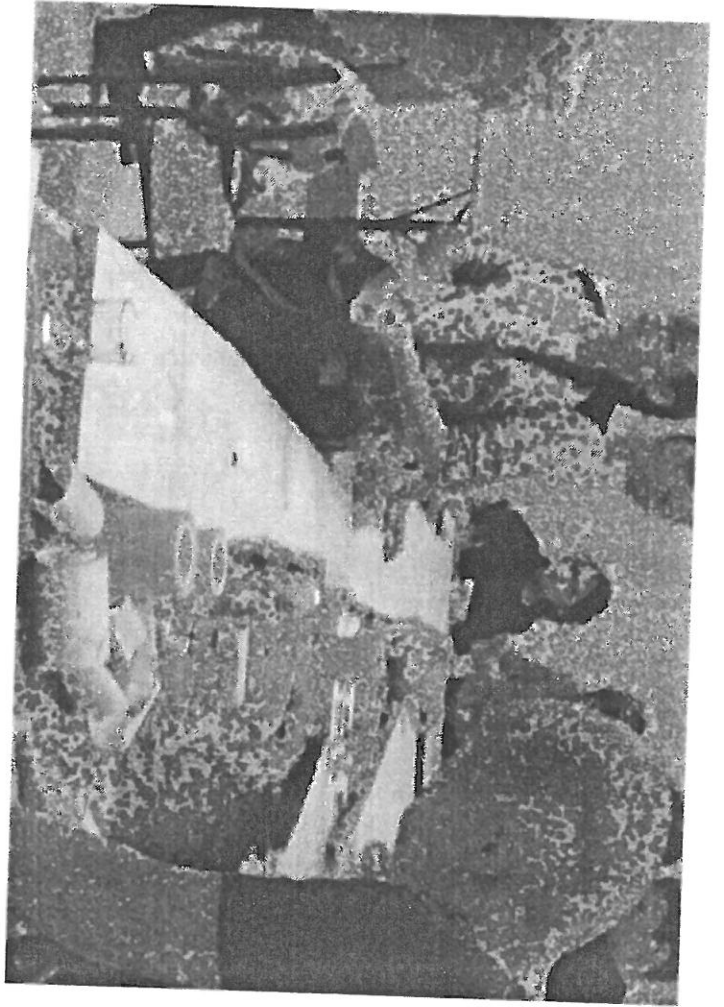

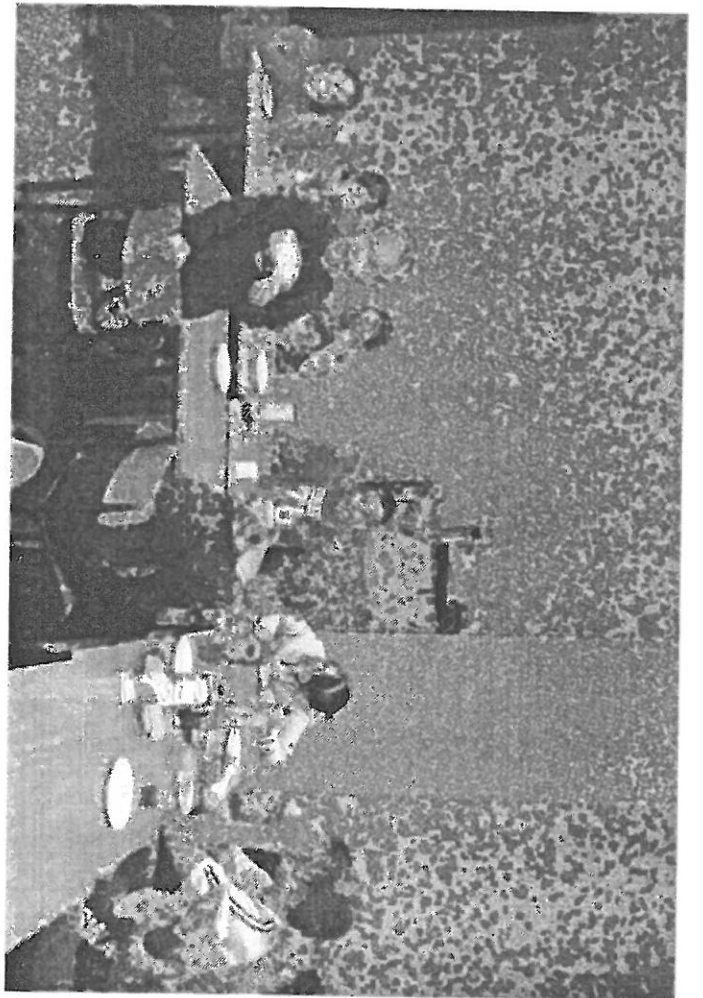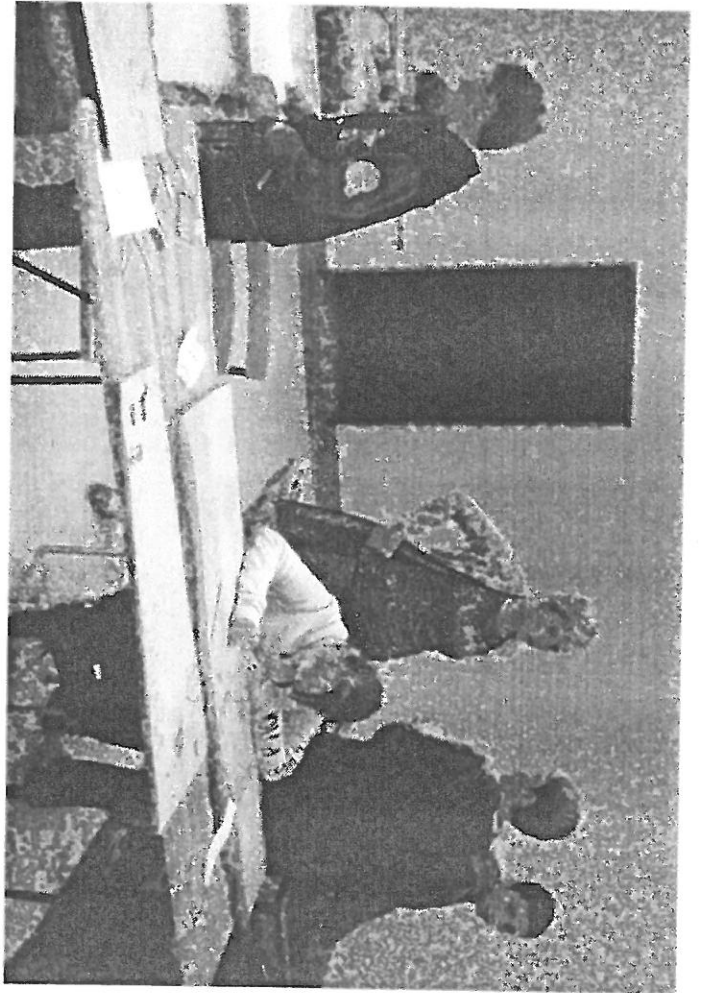


ZAPRASZAMY
NA ZAJĘCIA FITNESS

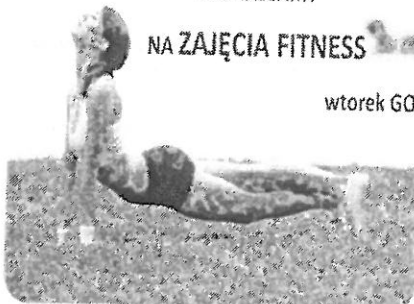

wtorek GODZ. 18:30

miejsce: ŚWIETLICA W ROKITACH



Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na zajęcia fitness, które odbywać się będą w każdy wtorek o godzinie 18:30 w Świetlicy Wiejskiej w Rokitach.



- ACTUALIZACJA**
- Uwaga Sini Watry
 - Protest lekarzy NZOZ w Czarnej Dąbrowie
 - Oferty - Staj! Benzynowej w Naszej Gminie
 - Dzielenia Świąteczne
 - Nowe stroje dla Zespołu Kaczubskiego



protokol.doc

Szukaj:

Szukaj

19
gru 2014

EDUKACJA POPRZEZ ZABAWĘ

By admin

Menu

Strona główna
Regulamin
Statut
Zarząd
Akademia
Fotomalarstwa
Kontakt

Najnowsze wpisy

EDUKACJA POPRZEZ
ZABAWĘ

Darowizna od firmy
Saponis Investments Sp.
z o.o.

Darowizna od firmy
Saponis Investments Sp.
z o.o.

Życzenia Świąteczne
Proekologia – strategia
przyszłości MŚP

Archiwa

Grudzień 2014
Październik 2014
Kwiecień 2014
Marzec 2014
Luty 2014
Listopad 2013
Październik 2013
Wrzesień 2013
Sierpień 2013
Czerwiec 2013
Maj 2013
Marzec 2013
Luty 2013
Styczeń 2013



W świetlicy Wiejskiej w Rokitach od 15 października przez 5 tygodni trwały warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się cyklicznie co tydzień po 3 godziny. Podczas warsztatów uczestnicy nabyli wiedzę w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

Dzieci same, przy niewielkiej pomocy rodziców wykonały prace ilustrujące hasła ekologiczne na deskach, które zostały umieszczone na Placu Wiejskim w Rokitach oraz nad Jeziorem Wiejskim. Celem warsztatów było uświadomienie podstawowych problemów ekologicznych, kształtowanie aktywnej postawy ekologicznej oraz szacunku dla przyrody. W przyszłości zamierzamy powtórzyć zajęcia dla różnych grup wiekowych. Podczas zajęć gościliśmy Panią Agnieszkę Głuszkiewicz oraz Panią Magdalenę Wesółkę, które rozmawiały z dziećmi o ekologii i pomagały w warsztatach.

Projekt był współfinansowany przez Starostwo Powiatowe Bytów, Nadleśnictwo Bytów oraz Nadleśnictwo Cewice a organizatorem było Stowarzyszenie Rokitnik.


Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy pomogli w organizacji zajęć dla dzieci „Edukacja przez zabawę”.




Zegar

DO - 22.01.2015

12:22:43




Pogoda



Najbliższe Święta

Dzisiaj - Dzień Dziecka
14.02 - Walentynki

Losowe zdjęcia

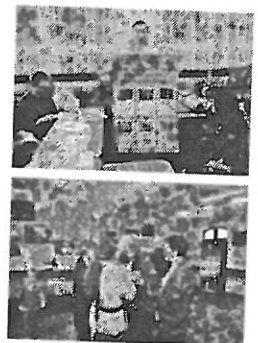

Licznik

Załącznik nr 3 - Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji/ Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.





I. Wykonanie robót budowlanych, elektrycznych, sanitarnych wynikających z kosztorysu powykonawczego Budowa Świetlicy Wiejskiej Rokitkach z dnia 25/04/2014 zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr GI.272.6.2013.AJ na wykonanie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz placu zabaw - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Oględziny miejsca realizacji projektu - miejscowość Rokity - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Dziennik budowy - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
4. Protokół z kontroli robót budowlanych, dokonywanych przez organ nadzoru budowlanego - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
5. Karta gwarancyjna nr 10/4 dot. elementów wyposażenia placu zabaw - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
6. Projekty budowlane wymienione w załączniku nr 2 niniejszego raportu - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

II. Roboty ulegające zakryciu i zanikające wynikające z kosztorysu powykonawczego Budowa Świetlicy Wiejskiej Rokitkach z dnia 25/04/2014 uznaje się za wykonane na podstawie:

1. Umowa nr GI.272.6.2013.AJ na wykonanie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz placu zabaw - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Dziennik budowy - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Protokół z kontroli robót budowlanych, dokonywanych przez organ nadzoru budowlanego - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

III. Roboty budowlane w zakresie prac wykończeniowych, prac wykonanych na dachu i elewacji budynku, wynikających z kosztorysu powykonawczego Budowa Świetlicy Wiejskiej Rokitkach z dnia 25/04/2014 wykonane są zgodnie z opisem i w lokalizacjach wskazanych w projekcie, w związku z powyższym uznaje się je za wykonanie zgodnie z projektem budowlanym.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT Jan Klusa	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	 INSPEKTOR Agata Kanas
			 INSPEKTOR Renata Bolwosta
			 PODIINSPEKTOR Marzena Trynda

IV. Wykonanie Poz. 215; 216; 264; 272; 282; 287; 348-354. kosztorysu inwestorskiego powykonawczego Budowa Świetlicy Wiejskiej Rokitkach z dnia 25/04/2014 w zakresie:

1. prób instalacji centralnego ogrzewania uznaje się za wykonane na podstawie:
 - Wpisy w dzienniku budowy - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
2. prób instalacji elektrycznej uznaje się za wykonane na podstawie:
 - Badania wewnętrznej instalacji elektrycznej (badanie stanu rezystencji instalacji elektrycznej; badanie ochrony przeciwpożarowej) - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
3. prób instalacji wodociągowej i kanalizacji uznaje się za wykonane na podstawie:
 - Protokołu z próby ciśnieniowej instalacji wodociągowej - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
 - Protokołu z próby szczelności i drożności kanalizacji - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
 - Protokoły z przeglądu technicznego i czynności konserwujących (hydranty zew. i wew.) **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**





V. Dodatkowe informacje do czynności kontrolnych:

Beneficjent złożył oświadczenie do SW w dniu 25/07/2014 o niespójnościach w kosztorysie inwestorskim w stosunku do projektu budowlanego. Roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i uwzględnione w kosztorysie powykonawczym Budowa Świetlicy Wiejskiej Rokitkach z dnia 25/04/2014

VI. Koszty ogólne:

1. Wykonanie dokumentacji technicznej, projektowej, kosztorysów zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr GK 08/2011 dot. wykonania dokumentacji technicznej (projekt budowlany; kosztorys inwestorski, specyfikacją techniczną)- **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Faktura VAT nr 4/11/2011 dot. dokumentacji technicznej - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Protokół przyjęcia przekazania dokumentacji projektowej. - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	 INSPEKTOR Agata Kanas
			 INSPEKTOR Regina Dąbrowska
			 PDSINSPEKTOR Marzena Trynda

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu powykonawczego	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu powykonawczego	Ilość wynikająca z ogólnin miejsca realizacji projektu	Różnica (4) - (3)	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Uwagi
	1	2	3	4	5	6	7
1.	82	szt.	15	15	0	n/d	n/d
2.	86	szt.	14	14	0	n/d	n/d
3.	97	m2	3,2	3,2	0	n/d	n/d
4.	98	m2	4,32	4,32	0	n/d	n/d
5.	99	m2	8,64	8,64	0	n/d	n/d
6.	100	m2	60,48	60,48	0	n/d	n/d
7.	101	m2	6,4	6,4	0	n/d	n/d
8.	102	szt.	8	8	0	n/d	n/d
9.	103	szt.	4	4	0	n/d	n/d
10.	104	szt.	24	24	0	n/d	n/d
11.	105	szt.	2	2	0	n/d	n/d
12.	106	m2	9,88	9,88	0	n/d	n/d
13.	107	m2	3,99	3,99	0	n/d	n/d
14.	108	m2	4	4	0	n/d	n/d
15.	109	m2	19,8	19,8	0	n/d	n/d
16.	110	m2	1,8	1,8	0	n/d	n/d
17.	111	m2	5,4	5,4	0	n/d	n/d
18.	112	m2	10,8	10,8	0	n/d	n/d
19.	113	m2	1	1	0	n/d	n/d
20.	141	szt.	2	2	0	n/d	n/d
21.	142	m	22,76	22,76	0	n/d	n/d
22.	143	m	6,16	6,16	0	n/d	n/d
23.	144	m	1,5	1,5	0	n/d	n/d
24.	145	m	1,4	1,4	0	n/d	n/d
25.	146	m	6,16	6,16	0	n/d	n/d
26.	147	szt.	1	1	0	n/d	n/d
27.	148	szt.	4	4	0	n/d	n/d
28.	149	szt.	1	1	0	n/d	n/d
29.	150	szt.	1	1	0	n/d	n/d
30.	151	szt.	1	1	0	n/d	n/d
31.	152	szt.	10	10	0	n/d	n/d
32.	169	m2	32,7	32,7	0	n/d	n/d
33.	173	m2	10,92	10,92	0	n/d	n/d
34.	186	m	77,6	n/d	n/d	n/d	nie zweryfikowano ze względu na pokrywą śnieżną
35.	191	m2	157,06	n/d	n/d	n/d	nie zweryfikowano ze względu na pokrywą śnieżną
36.	195	m	118	n/d	n/d	n/d	nie zweryfikowano ze względu na pokrywą śnieżną
37.	201	m2	264,18	n/d	n/d	n/d	nie zweryfikowano ze względu na pokrywą śnieżną
38.	213	szt.	28	28	0	n/d	n/d
39.	233	szt.	9	9	0	n/d	n/d
40.	236	kpl	14	12	2	14	na miejscu stwierdzono zamontowanie 11 kpl. umywalk, 1 kpl nie został zamontowany
41.	237	kpl	1	1	0	n/d	n/d
42.	238	kpl	4	4	0	n/d	n/d
43.	239	kpl	7	7	0	n/d	n/d
44.	240	kpl	1	1	0	n/d	n/d
45.	241	kpl	1	1	0	n/d	n/d
46.	242	szt.	1	1	0	n/d	n/d
47.	253	szt.	15	12	-3		na miejscu stwierdzono zamontowanie 11 szt. baterii, 1 szt nie został zamontowany
48.	254	szt.	1	1	0	n/d	n/d
49.	255	kpl	1	1	0	n/d	n/d
50.	257	kpl	2	2	0	n/d	n/d
51.	258	kpl	2	2	0	n/d	n/d
52.	263	szt.	2	2	0	n/d	n/d
53.	271	szt.	4	4	0	n/d	n/d
54.	331	szt.	22	22	0	n/d	n/d

Podpis podmiotu kontrolowanego

INSPEKTOR

Anna Kasper

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

INSPEKTOR

Regina Borowska


PODINSPEKTOR


Marzena Trynda

55.	332	szt	30	30	0	n/d	n/d
56.	333	szt	5	5	0	n/d	n/d
57.	334	szt	6	6	0	n/d	n/d
58.	335	szt	5	5	0	n/d	n/d
59.	336	szt	10	10	0	n/d	n/d
60.	337	szt	2	2	0	n/d	n/d
61.	338	szt	16	16	0	n/d	n/d
62.	339	szt	11	11	0	n/d	n/d
63.	360	m	223,4	n/d	n/d	n/d	nie zweryfikowano ze względu na pokrywą śnieżną
64.	366	m2	179,3	n/d	n/d	n/d	nie zweryfikowano ze względu na pokrywą śnieżną
65.	368	m	174,24	n/d	n/d	n/d	nie zweryfikowano ze względu na pokrywą śnieżną
66.	371	kpl	1	1	0	n/d	
67.	372	kpl	2	2	0	n/d	
68.	373	kpl	2	2	0	n/d	
69.	374	kpl	1	1	0	n/d	
70.	375	kpl	1	1	0	n/d	
71.	376	kpl	1	1	0	n/d	
72.	377	kpl	1	1	0	n/d	
73.	378	kpl	14	14	0	n/d	
74.	379	kpl	8	8	0	n/d	
75.	380	kpl	1	1	0	n/d	
76.	381	kpl	3	3	0	n/d	
77.	384	szt	250	n/d	n/d	n/d	nie zweryfikowano ze względu na pokrywą śnieżną
78.	385	szt	10	n/d	n/d	n/d	nie zweryfikowano ze względu na pokrywą śnieżną
79.	388	szt	211	n/d	n/d	n/d	nie zweryfikowano ze względu na pokrywą śnieżną
80.	389	szt	4	n/d	n/d	n/d	nie zweryfikowano ze względu na pokrywą śnieżną
81.	390	szt	23	n/d	n/d	n/d	nie zweryfikowano ze względu na pokrywą śnieżną
82.	391	szt	250	n/d	n/d	n/d	nie zweryfikowano ze względu na pokrywą śnieżną

WÓJT

 Agata Kanas

INSPEKTOR

 Agata Kanas

WSPERZAJĄCA

 Regina Dorowska

PODINSPEKTOR

 Marzena Trynda

Załącznik nr 4 - Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej/ Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.

I. Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej:

Koszty inwestycyjne oraz koszty ogólne projektu zweryfikowano na podstawie dokumentu: „wykaz faktur lub dokumentów wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty” stanowiącego pkt V do wniosku o płatność złożonego do SW dnia 08/10/2014 – Załącznik nr 4a.

II. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości dla transakcji związanych z realizacją operacji zweryfikowano na podstawie:





1. Zarządzenie nr 4/2013 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka w sprawie przyjęcia zasada (polityki) rachunkowości w Urzędzie Czarna Dąbrówka wraz z załącznikami - Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa
2. Zapisy kont księgowych– Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa
3. Dowody księgowe o których mowa w pkt. I i II

Dodatkowe informacje do czynności kontrolnych:

Na wydzielonym koncie księgowym dla danej operacji znajdują się wszystkie transakcje związane z realizowaną inwestycją (zarówno koszty kwalifikowane objęte dofinansowaniem, jak i koszty nie objęte dofinansowaniem, ale związane z realizacją inwestycji).

Załączniki:

- 4a. Kopia wykazu faktur lub dokumentów wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJTA Jan Klasa	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Agata Kanas INSPEKTOR
			 Regina Dorowska PODINSPEKTOR  Marzena Trynda

str. 3

V. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY

Lp	Nr faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	Data wystawienia faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	Nr księgowy/ewidencyjny faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	Nazwa wystawcy faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	NIP wystawcy faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	Pozycja na fakturze lub dokumencie o równoważnej wartości dowodowej albo nazwa towaru/usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym	Data zapłaty [dd/mm/rrrr]	Opis zdarzenia gospodarczego	Kwota wydatków całkowitych (zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych	
											(zł)	w tym VAT *
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
1	11/2013	27.12.2013	38/W	Zakład Budowlany "Bielawa" Franciszek Bielawa	8421155537	1	I.A.1-5, I.B.1-5, I.C.1-4, I.D.1-5, I.E.1-4	16.01.2014	BUDOWA świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw	298151,79	242399,83	0,00
2	1/2014	02.05.2014	401/W	Zakład Budowlany "Bielawa" Franciszek Bielawa	8421155537	1	I.A.1-4, I.B.1-4, I.C.1-4, I.D.1-5, I.E.1-4	19.05.2014	BUDOWA świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw	695687,51	565599,60	0,00
3	4/11/2011	30.11.2011	710/W	Projektowanie i nadzór Juliusz Bernat	8391443928	1,00	II.1	19.12.2011	dokumentacja techniczna	36900,00	30000,00	0,00
4												
5												
6												
7												
8												
...							RAZEM (zł)			1030739,30	837 999,43	0,00

* W kolumnie 11 należy wpisać kwotę VAT jedynie w przypadku, gdy VAT jest kosztem kwalifikowalnym. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0,00.

Załącznik nr 5 - Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych

I. Przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją wynikających z zestawienia rzeczowo – finansowe stanowiącego załącznik nr 1 do umowy o przyznanie pomocy nr 00346 – 6922 – UM1100284/12 z dnia 22/10/2012 z wraz z aneksami zweryfikowano na podstawie:

Poz. I – koszty inwestycyjne dot. budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokity wraz z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu przy świetlicy:

Pismo beneficjenta z dnia 19/06/2013r przekazujące dokumentację przetargową dotyczącą w/w zakresu - dostarczone do SW w dniu 21/06/2013 - Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.

Poz. II. – koszty ogólne : dokumentacja techniczna:

Wykonawca został wyłoniony w trybie art. 4 pkt 8 ustawy. Szacowana całkowita wartość zamówienia nie przekroczyła 14 000 tyś euro. (karta zamówienia – załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa)


II. Zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą zweryfikowano na podstawie:

1. Roboty budowlane

- Umowa nr GI.272.6.2013.AJ na wykonanie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz placu zabaw termin wykonania 15/04/2014r.
- Dziennik budowy termin odbioru robót 15/04/2014r.

2. Dokumentacja techniczna

- Umowa nr GK 08/2011 dot. wykonania dokumentacji technicznej (projekt budowlany; kosztorys inwestorski, specyfikacją techniczną)- termin wykonania 30/06/2011r.
- Protokół przyjęcia przekazania dokumentacji projektowej z dnia 30/06/2011r.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 W O J T Jan Klasa	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Agata Kanas
			INSPEKTOR  Regina Dorowska
			PODLASPEKTOR  Marzona Trynda

Załącznik nr 6 - Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc/ Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.

I. Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc zweryfikowano na podstawie:




1. Karty środka trwałego – załącznik nr 6a
2. Wydruk z konta 011-01; 011-02 - Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa
3. Dokumentów finansowo – księgowych o których mowa w załączniku nr 4.

II. Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc zweryfikowano na podstawie:

1. Projekty budowlane wymienione w załączniku nr 2 niniejszego raportu - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dot. placu zabaw - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Decyzja nr 500/2011/C zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dot. budowy świetlicy - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
4. Decyzja pozwolenie na użytkowanie nr PINB/ID/70032-3/24/2014 dot. świetlicy wiejskiej - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
5. Oględziny miejsca realizacji projektu – miejscowość Rokitki- **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
6. Oświadczenie beneficjenta – **załącznik nr 6b**
7. Wyjaśnienia Beneficjenta – **załącznik 2a**

Załączniki:

- 6a. Karty środka trwałego
- 6b. Oświadczenie beneficjenta

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT Jan Klasa	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Agata Kanas
			INSPEKTOR  Regina Dorowska

FOKINSPEKTOR

Marzena Trynda

267. 82

KARTA POZYCJI MAJĄTKU TRWAŁEGO

Jednostka : GMINA CZARNA DĄBRÓWKA

GMINA CZARNA DĄBRÓWKA

77-116 CZARNA DĄBRÓWKA GDAŃSKA 5

Rodzaj majątku : Środki Trwałe
 Symbol KRST : 1-10-107-0001
 Symbol komórki organizacyjnej : 700000 GMINA CZARNA DĄBRÓWKA
 Nazwa pozycji MT : ŚWIETLICJA WIEJSKA W MIEJSCOWOŚCI ROKITY
 Ilość : 1.0000
 Cena : 998 782.62 zł
 Rok produkcji :
 Data przyjęcia : 2014-06-18
 Numer fabryczny :
 Numer inwentarzowy : 38/10/107
 Dostawca Wykonawca :
 Konto kosztów :
 Osoba odpowiedzialna : JAŚNIAK ARLETA
 Rodzaj konstrukcji :
 Wymiary :
 Części składowe :
 Typ własności : WŁASNE
 Źródła finansowania : DOTACJE
 Sposoby wykorzystania : NA CELE WŁASNE
 Pochodzenie : INWESTYCJA
 Metoda naliczania umorzenia : Liniowa
 Okres naliczania umorzenia : Roczne
 Stawka procentowa umorzenia : 2.50 %
 Wartość początkowa : 998 782.62 zł Umorzenie narastające : 12 484.78 zł
 Wartość netto : 986 297.84 zł Umorzenie roczne : 12 484.78 zł
 Charakterystyka :
 OBIEKT DWUKONDYGNACYJNY W TECHNOLOGII TRADYCYJNEJ, KUBATURA - 2.562,61 M3, PO. ZABUDOWY - 315,01 M2, POW. CAŁKOWITA - 534,48 M2.

Data Operacji	Symbol i Nr dok.	Przyczyna zmiany				
Data Wystawienia	Wartość początkowa zł.	Umorzenie narastające zł		Stawka % umorzenia	Umorzenie zł.	
		dotychczasowe	po zmianie		miesięczne	roczne
2014-06-18	OT 03A/14					
2014-06-18	998 782.62 zł	0.00 zł	0.00 zł	2.50 %	0.00 zł	0.00 zł

Koniec wydruku Majątek Trwały

Operator systemu : WICZK CELINA

W O J T




KARTA POZYCJI MAJĄTKU TRWAŁEGO

Jednostka : GMINA CZARNA DĄBRÓWKA

GMINA CZARNA DĄBRÓWKA

77-116 CZARNA DĄBRÓWKA GDAŃSKA 5

Rodzaj majątku : Środki Trwałe
 Symbol KRST : 2-29-290-0001
 Symbol komórki organizacyjnej : 700000 GMINA CZARNA DĄBRÓWKA
 Nazwa pozycji MT : ŚCIEŻKA SPACEROWA WRAZ Z PLACEM ZABAW W MIEJSCOWOŚCI ROKITY
 Ilość : 1.0000
 Cena : 106 627.49 zł
 Rok produkcji :
 Data przyjęcia : 2014-06-18
 Numer fabryczny :
 Numer inwentarzowy : 115/23/290
 Dostawca Wykonawca :
 Konto kosztów :
 Osoba odpowiedzialna : CISZEWSKA AGNIESZKA
 Rodzaj konstrukcji :
 Wymiary :
 Części składowe :
 Typ własności : WŁASNE
 Źródła finansowania : DOTACJE
 Sposoby wykorzystania : NA CELE WŁASNE
 Pochodzenie : INWESTYCJA
 Metoda naliczania umorzenia : Liniowa
 Okres naliczania umorzenia : Roczne
 Stawka procentowa umorzenia : 2.50 %
 Wartość początkowa : 106 627.49 zł Umorzenie narastające : 1 332.84 zł
 Wartość netto : 105 294.65 zł Umorzenie roczne : 1 332.84 zł

Charakterystyka :

PLAC ZABAW DLA DZIECI: DOSTARCZENIE I MONTAŻ ZESTAWU ZABAWOWEGO - DRABINKI, DOMKI, ZJEŻDŻALNIE ITP.

WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6 CM BEZ FAZKI - 157,50 M2.

WYKONANIE NAWIERZCHNI PIASKOWYCH W STREFACH BEZPIECZEŃSTWA.

NASADZENIA ROŚLINNE I TRAWNIKI

Data Operacji	Symbol i Nr dok.	Przyczyna zmiany				
Data Wystawienia	Wartość początkowa zł.	Umorzenie narastające zł		Stawka % umorzenia	Umorzenie zł.	
		dotychczasowe	po zmianie		miesięczne	roczne
2014-06-18	OT 03B/14					
2014-06-18	106 627.49 zł	0.00 zł	0.00 zł	2.50 %	0.00 zł	0.00 zł

Koniec wydruku Majątek Trwały

Operator systemu : WICZK CELINA

WÓJCI
 Jan Klusa

[Handwritten signature]

Czarna Dąbrówka dnia 21/01/2015

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż Gmina Czarna Dąbrówka

- nie dokonała przeniesienia posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana i ma być wypłacona pomoc
- wykorzystuje zgodnie z przeznaczeniem nabyte dóbr, wybudowane, przebudowane, wyremontowane lub zmodernizowane budynki lub budowle, na które została przyznana pomoc.

WÓJT
Jan Cichy

[Handwritten signature]
